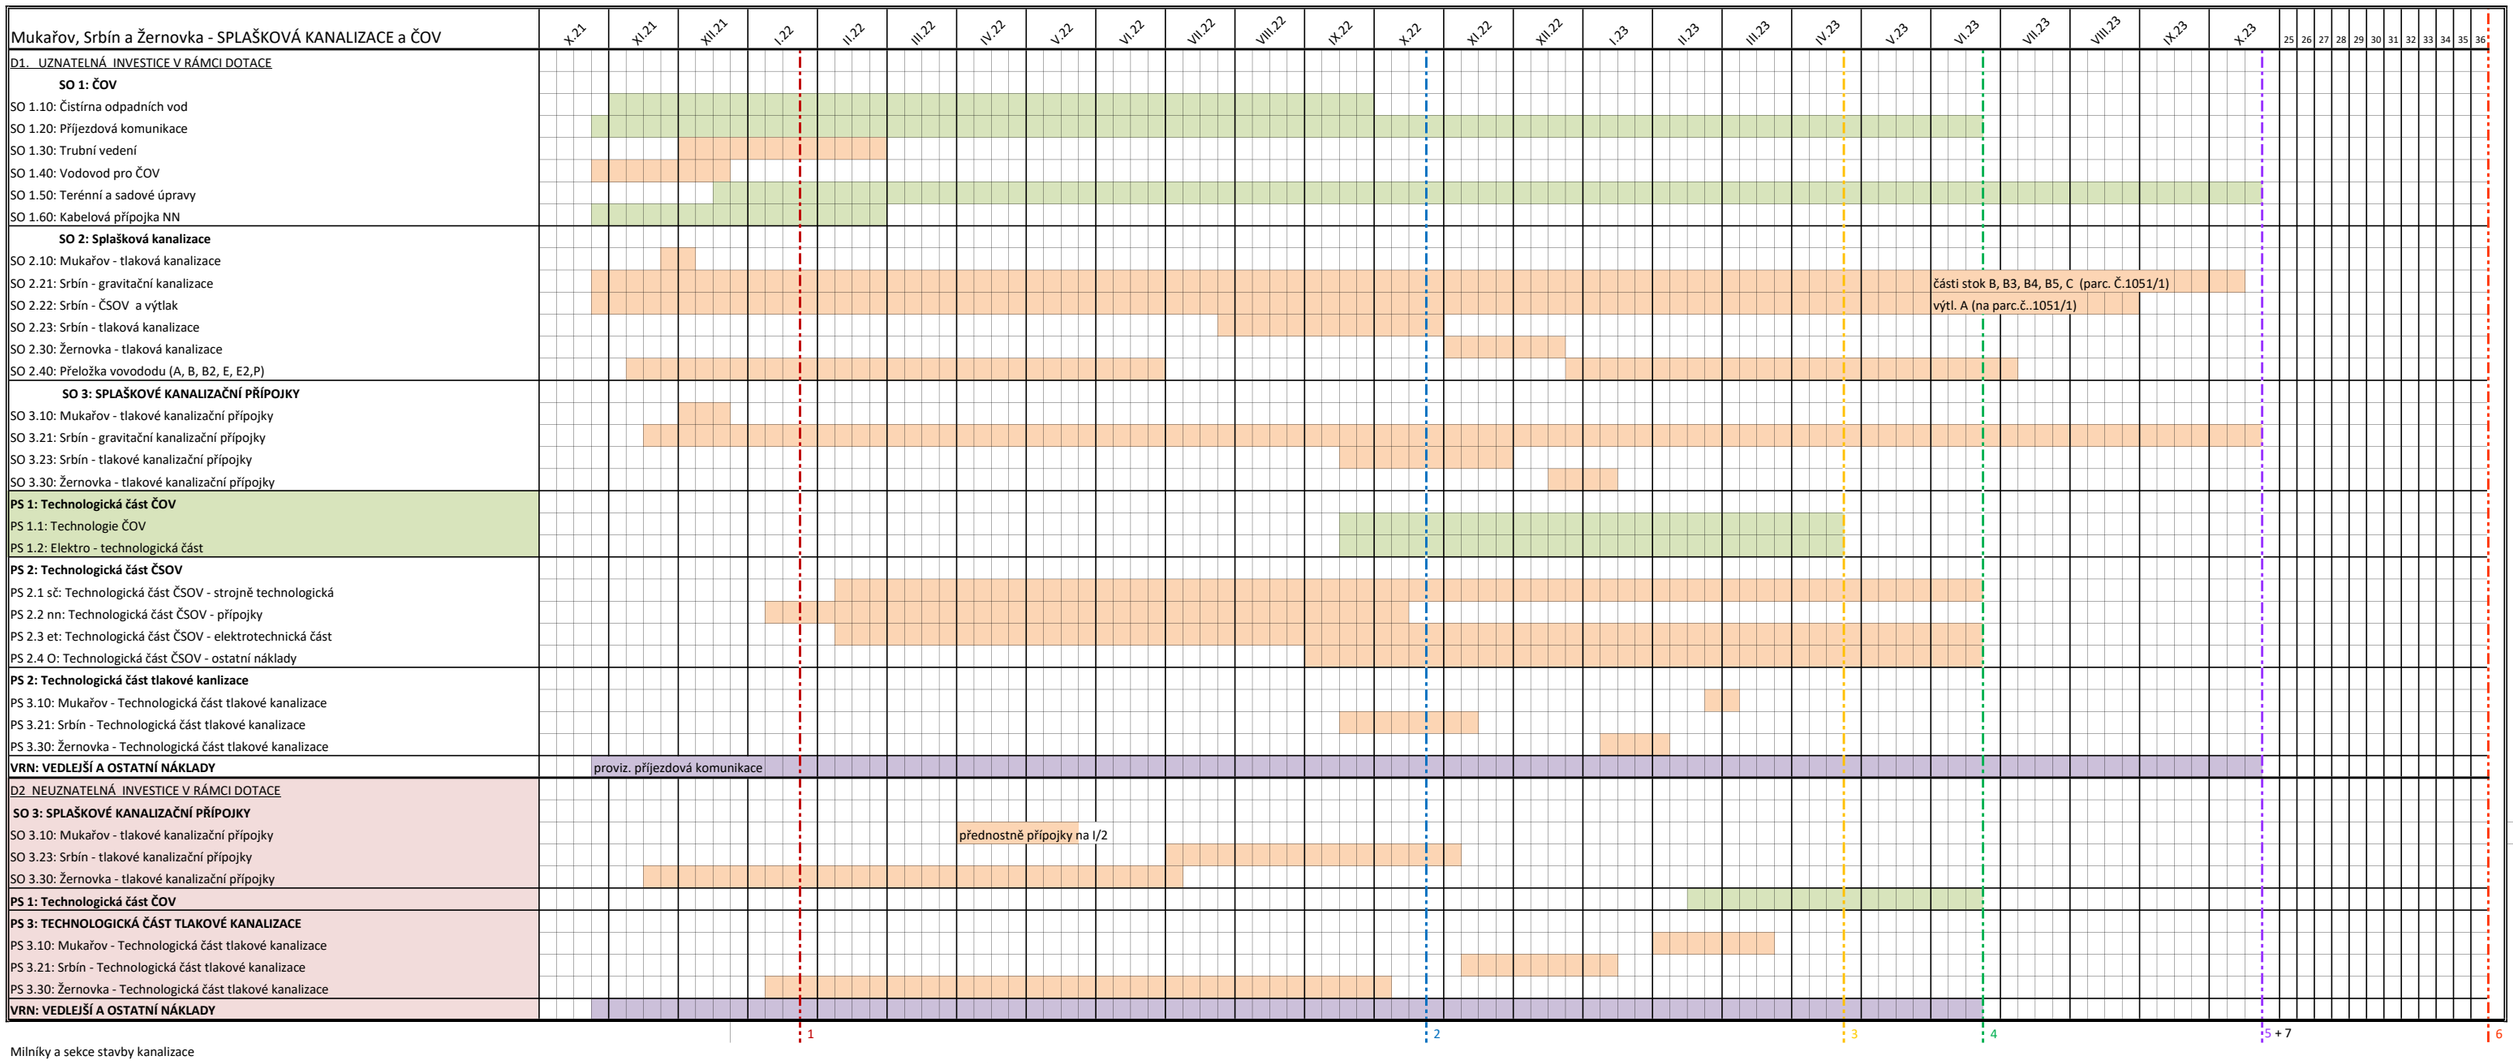

Milníky a sekce stavby kanalizace

Popis	Název	Milník č.	lhůta (měs.)	zahájení lhůty	poznámka
Provizorní příjezd. komun. k ČOV, vč. oklepové zóny	Příjezdová komunikace	1	3	předání staveniště	
Výstavba hrubé stavby ČOV - od základů po zastřešení stavby, včetně	ČOV hrubá stavba	2	12	předání staveniště	zahájení stavby objektu ČOV po dokončení provizorní příjezdové komun.
Dokončení ČOV vč. technologie, zahájení příprav ČOV ke zkušebnímu provozu	Dokončení stavby ČOV	3	18	předání staveniště	
Výstavba přípojek tlakové kanalizace na předpoložen. řadech, vč. zprovoznění ČS	Přípojky TK na suchovodu	4a	20	předání staveniště	přednostní vystavBA přípojky na I/2 kvůli plánované rekonstrukce vozovky!
Gravitační kanalizace (GK), vč. výtlaků a ČSOV (mimo 1051/1)	Gravitační kanal. (mimo 1051/1)	4b	20	předání staveniště	
Výstavba všech nových řadů tlakové kanalizace (TK), včetně přípojek	Tlaková kanaliz. nová	4c	20	předání staveniště	přednostní vystavBA přípojky na I/2 kvůli plánované rekonstrukce vozovky!
Výstavba přípojek gravitační kanalizace (mimo přípojek na 1051/1)	Přípojky GK (mimo 1051/1)	4d	20	předání staveniště	
Stavba na pozemku 1051/1 Srbín - části stok a přípojky ((části stok B, B3, B4, B5 a C, výtlak A v úsekách: Š B-55 až Š B-33; Š B3-1 až Š B- 46; Š B4-1 až Š B-45; B5; Š C-12 až Š C-3; VT A st.0,380 až st.0,455)	Odložená stavba na parc.č.1051/1, KsúS	5a	24	předání staveniště	realizování výstavby jako poslední etapy celé stavby - doba udržitelnosti projektu KSUS na opravu II/113! (Silnice nesmí být uzavřena - jen kyvadlově!)
Dokončení celého díla ke zkušebnímu provozu	Zahájení zkušebního provozu	5b	24	předání staveniště	
Kolaudace po završení 12 měs. zkušebního provozu	Kolaudace díla	6	36	předání staveniště	předmětem díla dle této smlouvy není kolaudace hotového díla,
Dokončení úpravy povrchu do generálního termínu smlouvy o dílo	Finální povrchy komunikací	7	24	předání staveniště	
